

新病院建設委員会ニュース 第18号



工事スケジュール

いよいよ完成が近づいてきました！

既に新病院の外観工事は終了し、現在は内装、外構工事が開始しています。最終の引渡しは、各種検査を行い10月末を予定しています。工事自体は、計画通り進めば9月末頃に完了します。

2020年
8月
外構工事（フェンス、駐車場工事等）、内装（壁紙、床工事等）、造り家具据え付け

9月
調整工事、片付け、清掃



工事の様子



建設委員会 確認事項

下記の内容が建設委員会にて確認されています。

1 法人ロゴマークに関して

リニューアルを機に健康生協のロゴを作成し、新病院看板に取りつける案が検討されていました。議論の結果、今回はロゴマーク作成を見送る事になりました。


2 外来イメージ図

内装、サインのデザインは、京都建築事務所と委託契約を交わしている、高知県のしろくまデザインさんに担当して頂いています。現在は1F部分のデザイン案が議論され、木目と白を基調に、ナチュラルなイメージで進んでいます。※イメージ図は一部のみ着色です。



3 外来のイメージ図-2

外来の各科診察室は、一目で分かるよう色分けされたデザインを検討しています。デザイナーさんからの提案でワンポイとして、阿波の伝統工芸品（阿波しじら織）の要素を取り入れていきます。

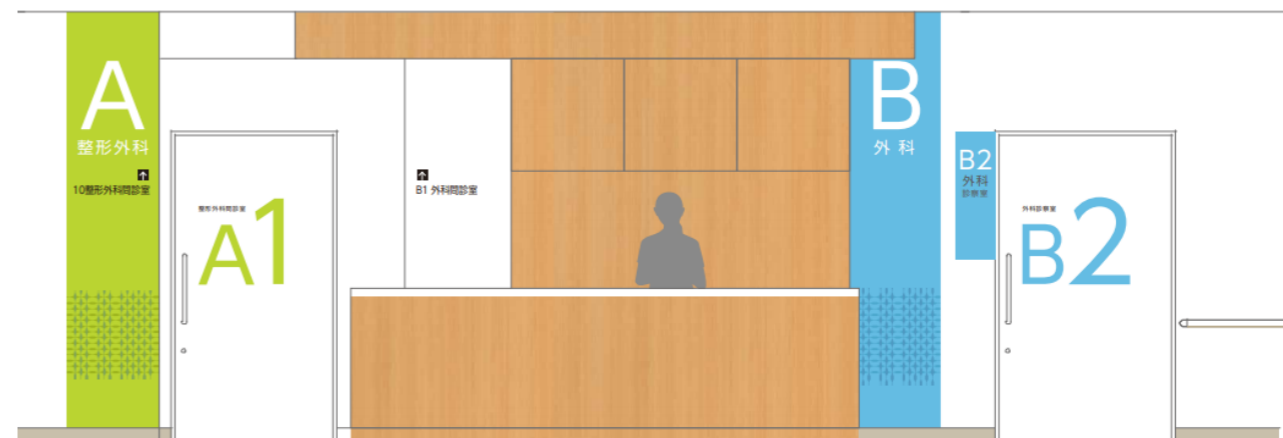

- サインベースカラー
ビビッド色
落ち着いた色
- 各科名の配置
カウンターバックの壁面
各科サインに表示
- サインパターン
有り
無し



Cplan




裏面に
続く！

建設委員会
確認事項

4 大栗清實医師の石碑設置について


徳島健康生活協同組合の設立にご尽力された、大栗医師の石碑を新病院駐車場内へ設置する事が確認されました。現在、石碑は阿南診療所に設置されており、新病院建設を機に移設する事になります。

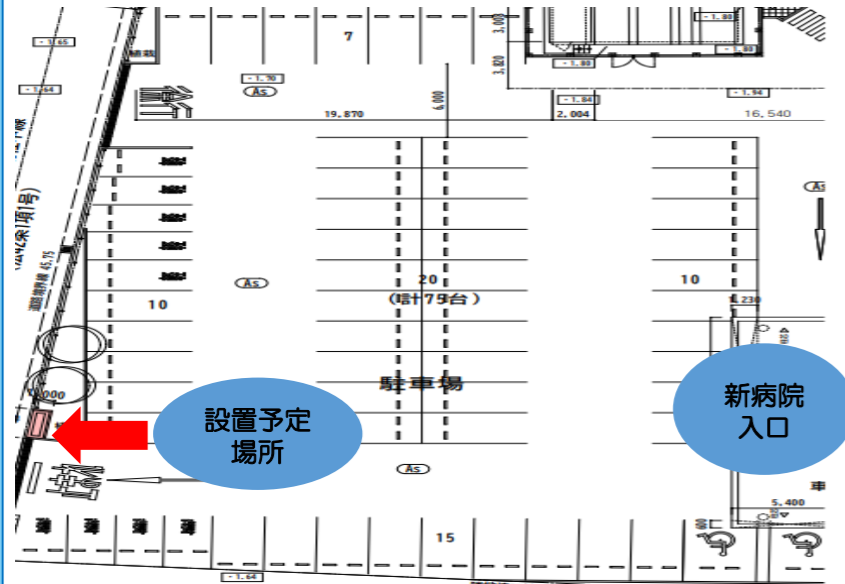

石碑 サイン(出口)

5 正面玄関入口(風除室)のデザインについて

風除室の壁にはレンガ調のボーダータイル、床はノンスリップタイルが採用される事になります。サイン計画(案内板)もイメージ図のように、見やすい配置を検討しています。

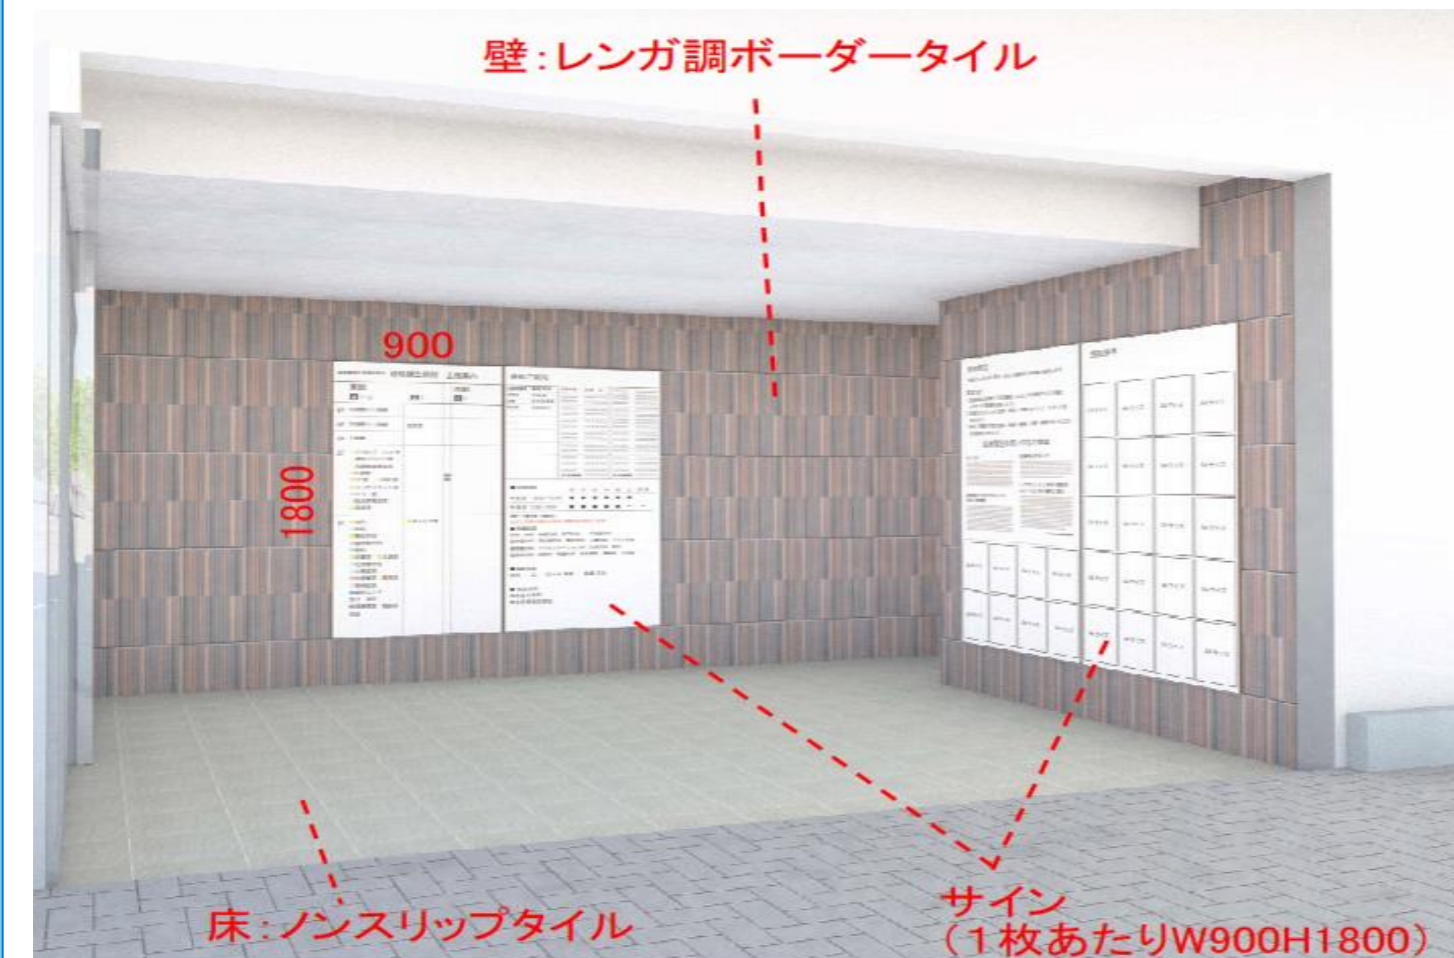

床:ノンスリップタイル

サイン
(1枚あたりW900H1800)

壁:レンガ調ボーダータイル

6 手術室1・2のカラーについて

手術室1・2の全体カラーがイメージ図のように決定しました。実際に手術をされる、先生方からも意見を頂き検討しました。

【手術室1 パース図】



【手術室2 パース図】



7 移転(引越し)検討会議について

新病院の引き渡し後、いよいよ引越し、東館改修工事(年明け予定)がスタートします。引越し業者は日本通運㈱に決定し、事務局、職員代表者、日本通運、コンサル合同の会議を毎月開催し、移転マニュアルの作成を行っています。物品の梱包、搬出、患者移送など職員の皆さんは様々な不安や疑問があるかと思いますが、職員全体への説明会、移転の予行練習など10~12月上旬にかけて予定しています。順次発信していきますので宜しくお願いします。現時点では最終確定していませんが、12月の3週目に移転作業、オープンを計画しています。

●移転検討会議

①移転総合調整会議(多職種検討会議にて開催)毎月第2・4火曜日 14:00~

メンバー

医師、看護師、薬剤師、理学療法士、事務(システム、医事担当)
ソーシャルワーカー、検査技師、管理栄養士、放射線技師、臨床工学技士
日本通運(担当者3名)、コンサル(担当者2名)、事務局(担当者2名)

主な検討事項

(移転前後)各部門の診療体制、物品搬出、緊急時対応マニュアル作成、共有

②患者移送検討会議(師長会議の一部で開催)毎月第1水曜日 1~2時間程度

メンバー

医師、看護部長、副部長、各師長、医療安全管理者
日本通運(担当者3名)、コンサル(担当者2名)、事務局(担当者2名)

主な検討事項

移転当日の患者搬送計画、緊急時の対応等についてマニュアル作成、共有

